

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В ОБЛАСТ РУСЕ

МАЙ 2017 Г. РУСЕ

РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В ОБЛАСТ РУСЕ 2011-2016 ГОДИНА, ПЕРСПЕКТИВИ

- ПОДСТАНЦИИ И ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ
- МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
- МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
- ЕЛЕКТРОМЕРНО СТОПАНСТВО
- АВАРИЙНОСТ
- ПРОБЛЕМИ
- ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДСТАНЦИИ И ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ

- ПОДМЕНЕНИ ВСИЧКИ ПРЕКЪСВАЧИ С ВАКУУМНИ
- ПОДМЕНЕНИ ВСИЧКИ ЗАЩИТИ С ЦИФРОВИ
- ИЗГРАДЕНА ТЕЛЕМЕХАНИКА
- ПОДНОВЕН ЦУМ
- ТЕЛЕМЕХАНИЗИРАНА ВС „МИНЗУХАР“

МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ

- МОНТИРАНИ РИКЛОУЗЕРИ И МОЩНОСТНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ
- ПРИКЛЮЧЕН ПРОЦЕС ПО ПОДМЯНА НА ИЗОЛАЦИЯТА
- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ЧРЕЗ ПОДМЯНА СЪЛБОВЕ И ПРОВОДНИК
- ПОДМЯНА НА СТАРИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ

МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ


- КАБЕЛИРАНЕ НА ВЪЗДУШНИ МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
- ПОДМЯНА НА ВЪЗДУШНИ МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ С
УСУКАН ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК
- РЕХАБИЛИТАЦИЯ МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЧРЕЗ
ПОДМЯНА СТЬЛБОВЕ, ИЗОЛАЦИЯ И ПРОВОДНИК

ЕЛЕКТРОМЕРНО СТОПАНСТВО


- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МЕРЕНЕ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
- ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА „ФРОДЕКСИМ“ ЗА ОТЧЕТ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
- ВЪВЕЖДАНЕ НА СМАРТ СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
- ПОДМЯНА ЕЛЕКТРОМЕРИ С ИЗТЕКЛА МЕТРОЛОГИЯ
- ИЗНАСЯНЕ НА СТИ НА ГРАНИЦАТА НА ИМОТА

Изпълнение на неплановите показатели SAIFI и SAIDI на РЦ Русе до 31.12.2016

	План 2016	Изпълнение	Изменение, %
I	0.01	0.00	-100%
II	0.01	0.01	0%
III	0.04	0.04	0%
IV	0.05	0.05	0%
V	0.06	0.06	0%
VI	0.08	0.07	-13%
VII	0.10	0.09	-10%
VIII	0.11	0.10	-9%
IX	0.12	0.10	-17%
X	0.13	0.11	-15%
XI	0.15	0.11	-27%
XII	0.15	0.11	-27%

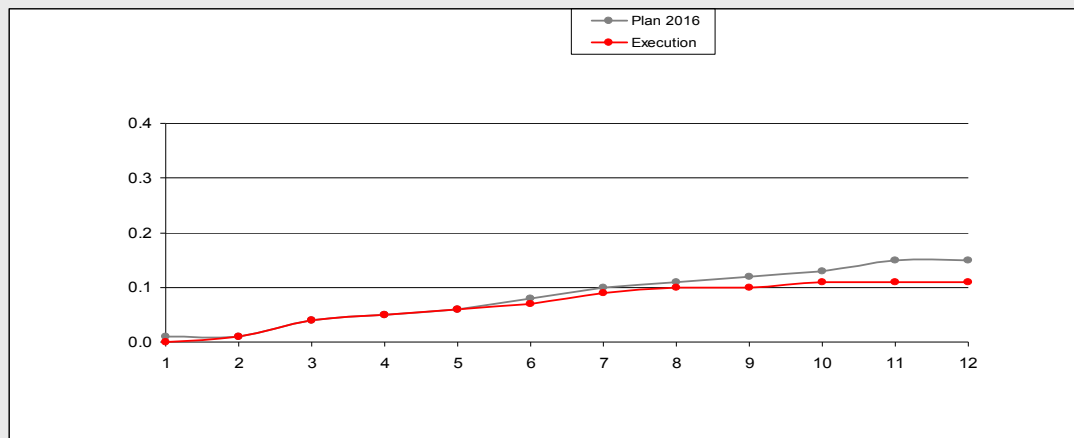

	План 2016	Изпълнение	Изменение, %
I	0.81	0.17	-79%
II	1.05	0.53	-50%
III	1.26	1.71	36%
IV	1.84	2.38	29%
V	2.20	3.17	44%
VI	3.16	3.39	7%
VII	3.98	4.06	2%
VIII	4.24	4.21	-1%
IX	4.53	4.34	-4%
X	5.42	4.78	-12%
XI	6.41	4.83	-25%
XII	6.69	5.02	-25%

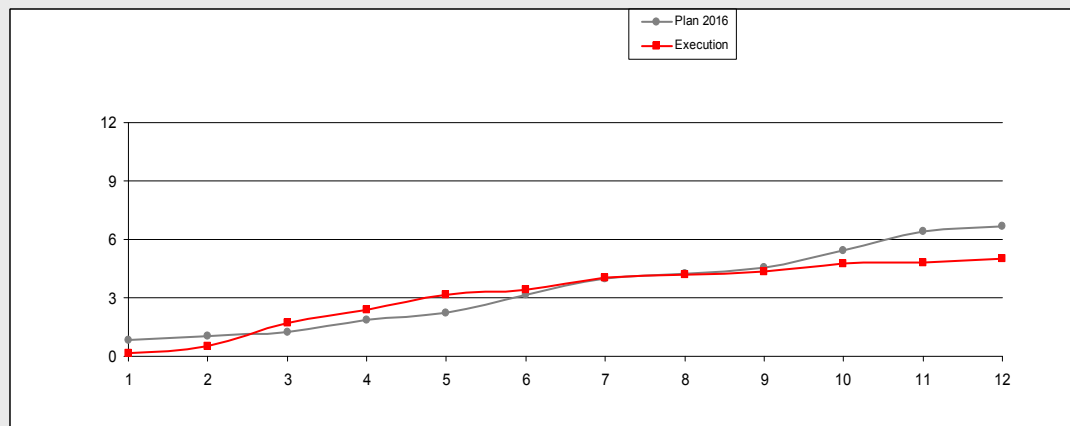

ПРОБЛЕМИ

- НЕСПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ
- НЕСПАЗВАНЕ НА НАРЕДБА 16-116 ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
- НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ОТ ФИРМИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛКИ НА ПРОСЕКИ

ПЕРСПЕКТИВИ

- ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗЛОВА СТАНЦИЯ В ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
- ИЗГРАЖДАНЕ НА БКТП НИКОЛАЕВ
- ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛ СРН В ЧАРОДЕЙКА
- ТЕЛЕМЕХАНИКА ВЪВ ВС АРЕНА
- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМИ 2017 Г. СЪОТВЕТНО ЗА 3 433 ХИЛ. ЛВ И 703 ХИЛ. ЛВ.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО
